

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC
 DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO No. 27 COL. CENTRO ZACATEPEC, MORELOS C.P. 62780

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: 13 DIA 2 MES 2017 AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DIA 2 MES 2017 AÑO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
PROXCESS 2016	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL ÁREA DE HIDRÁULICA ÁREA DE ESTUDIO DEL CONCRETO, CUARTO HÚMEDO, BODEGA Y OFICINA DEL JEFE DE LABORATORIO	5,304,000.00 \$	-	5,304,000.00 \$	100%	3,135,186.16 \$	4872	4743	100%	EN ESPERA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y PARA INAUGURARSE EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018.
PROXCESS 2016	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL	3,182,298.80 \$	-	3,182,298.80 \$	0%	-	4872	4743	0%	LICITACIÓN CANCELADA SEGÚN ART. 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARTÍCULO 100 DEL SECTOR PÚBLICO PARA REALIZAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EXISTE UNA RETENCIÓN DE ECONOMÍAS QUE SE SOLICITO APLICAR EN EQUIPAMIENTO SIN RESPUESTA HASTA EL MOMENTO. SE SOLICITO LA REACTIVACIÓN DE LA LICITACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO Y SE CONTINUA EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DIRECTA.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: DRA. ANA LUZ TEJEDA GUTIÉRREZ
 CARGO: JEFA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: anamaluzte@facitepec.edu.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 7843432110 ext. 229

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE: ING. ROBERTO ORTIZ DELGADILLO
 FIRMA: 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SELO OFICIAL



SECRETARÍA DE
BANCAARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS
 AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR) LEGISLACIÓN NACIONAL
 DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO
 DE ZACATEPEC
 DIRECCIÓN



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017) PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA) PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO	
ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, AREA DE HIDRAULICA, AREA DE ESTUDIO DEL CONCRETO, CUARTO HUMEDO, BODEGA Y OFICINA DEL JEFE DE LABORATORIO
	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, AREA DE HIDRAULICA, AREA DE ESTUDIO DEL CONCRETO, CUARTO HUMEDO, BODEGA Y OFICINA DEL JEFE DE LABORATORIO

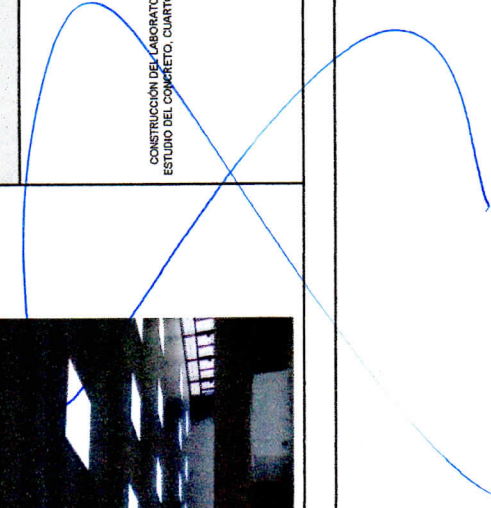

Cuernavaca, Mor., a 08 de enero de 2018

**ING.ROBERTO ORTIZ DELGADILLO
DIRECTOR INSTITUTO TÉCNOLOGICO DE ZACATEPEC
PRESENTE**

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD INFORME FINAL FISICO-FINANCIERO

Por medio del presente, en relación al informe final Físico-Financiero del recurso PROEXOES 2016, asignado al Instituto Tecnológico de Zacatepec para la construcción y equipamiento del Laboratorio de Ingeniería civil. **Se anexa tabla con la siguiente información:**

INFORME FISICO - FINANCIERO CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL					
FECHAS	STATUS OBRA	MONTOS S/IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO (pagado)
13 DE FEBRERO 2017	INICIO DE OBRA (Contrato).	\$ 4,170,985.12	0%	0%	\$ -
05 DE MARZO 2017	PROCESO DE OBRA	\$ 166,839.40	4%	4%	\$ -
06 DE MARZO 2017	FECHA SUSPENSION	\$ 166,839.40	4%	4%	\$ -
27 de abril de 2017	FECHA REINICIO OBRA	\$ 166,839.40	4%	4%	\$ -
2 de mayo de 2017	PROCESO DE OBRA	\$ 157,705.74	8%	8%	\$ 324,545.14
25 de junio de 2017	PROCESO DE OBRA	\$ 499,031.69	20%	20%	\$ 499,031.69
25 de julio de 2017	PROCESO DE OBRA	\$ 277,265.45	27%	27%	\$ 277,265.45
24 de agosto de 2017	PROCESO DE OBRA	\$ 416,012.68	37%	37%	\$ 416,012.68
8 de septiembre de 2017	PROCESO DE OBRA	\$ 666,247.57	53%	53%	\$ 666,247.57
23 de septiembre de 2017	PROCESO DE OBRA	\$ 952,083.62	76%	76%	\$ 952,083.62
30 de septiembre de 2017	PROCESO DE OBRA	\$ 1,035,798.97	100%	100%	\$ -
		\$ 4,170,985.12			\$ 3,135,186.15

Agradeciendo de antemano la atención que sirva dar al presente, me despido de usted

ATENTAMENTE

ING. ALEJANDRA VILLARRREAL VILLARREAL
DIRECTORA GENERAL DEL INEIE



**VISIÓN
MORELOS**
